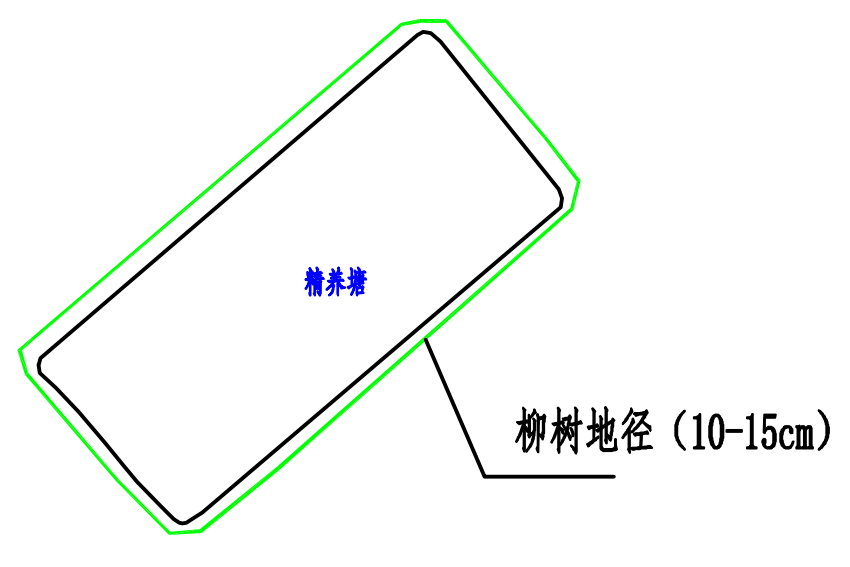

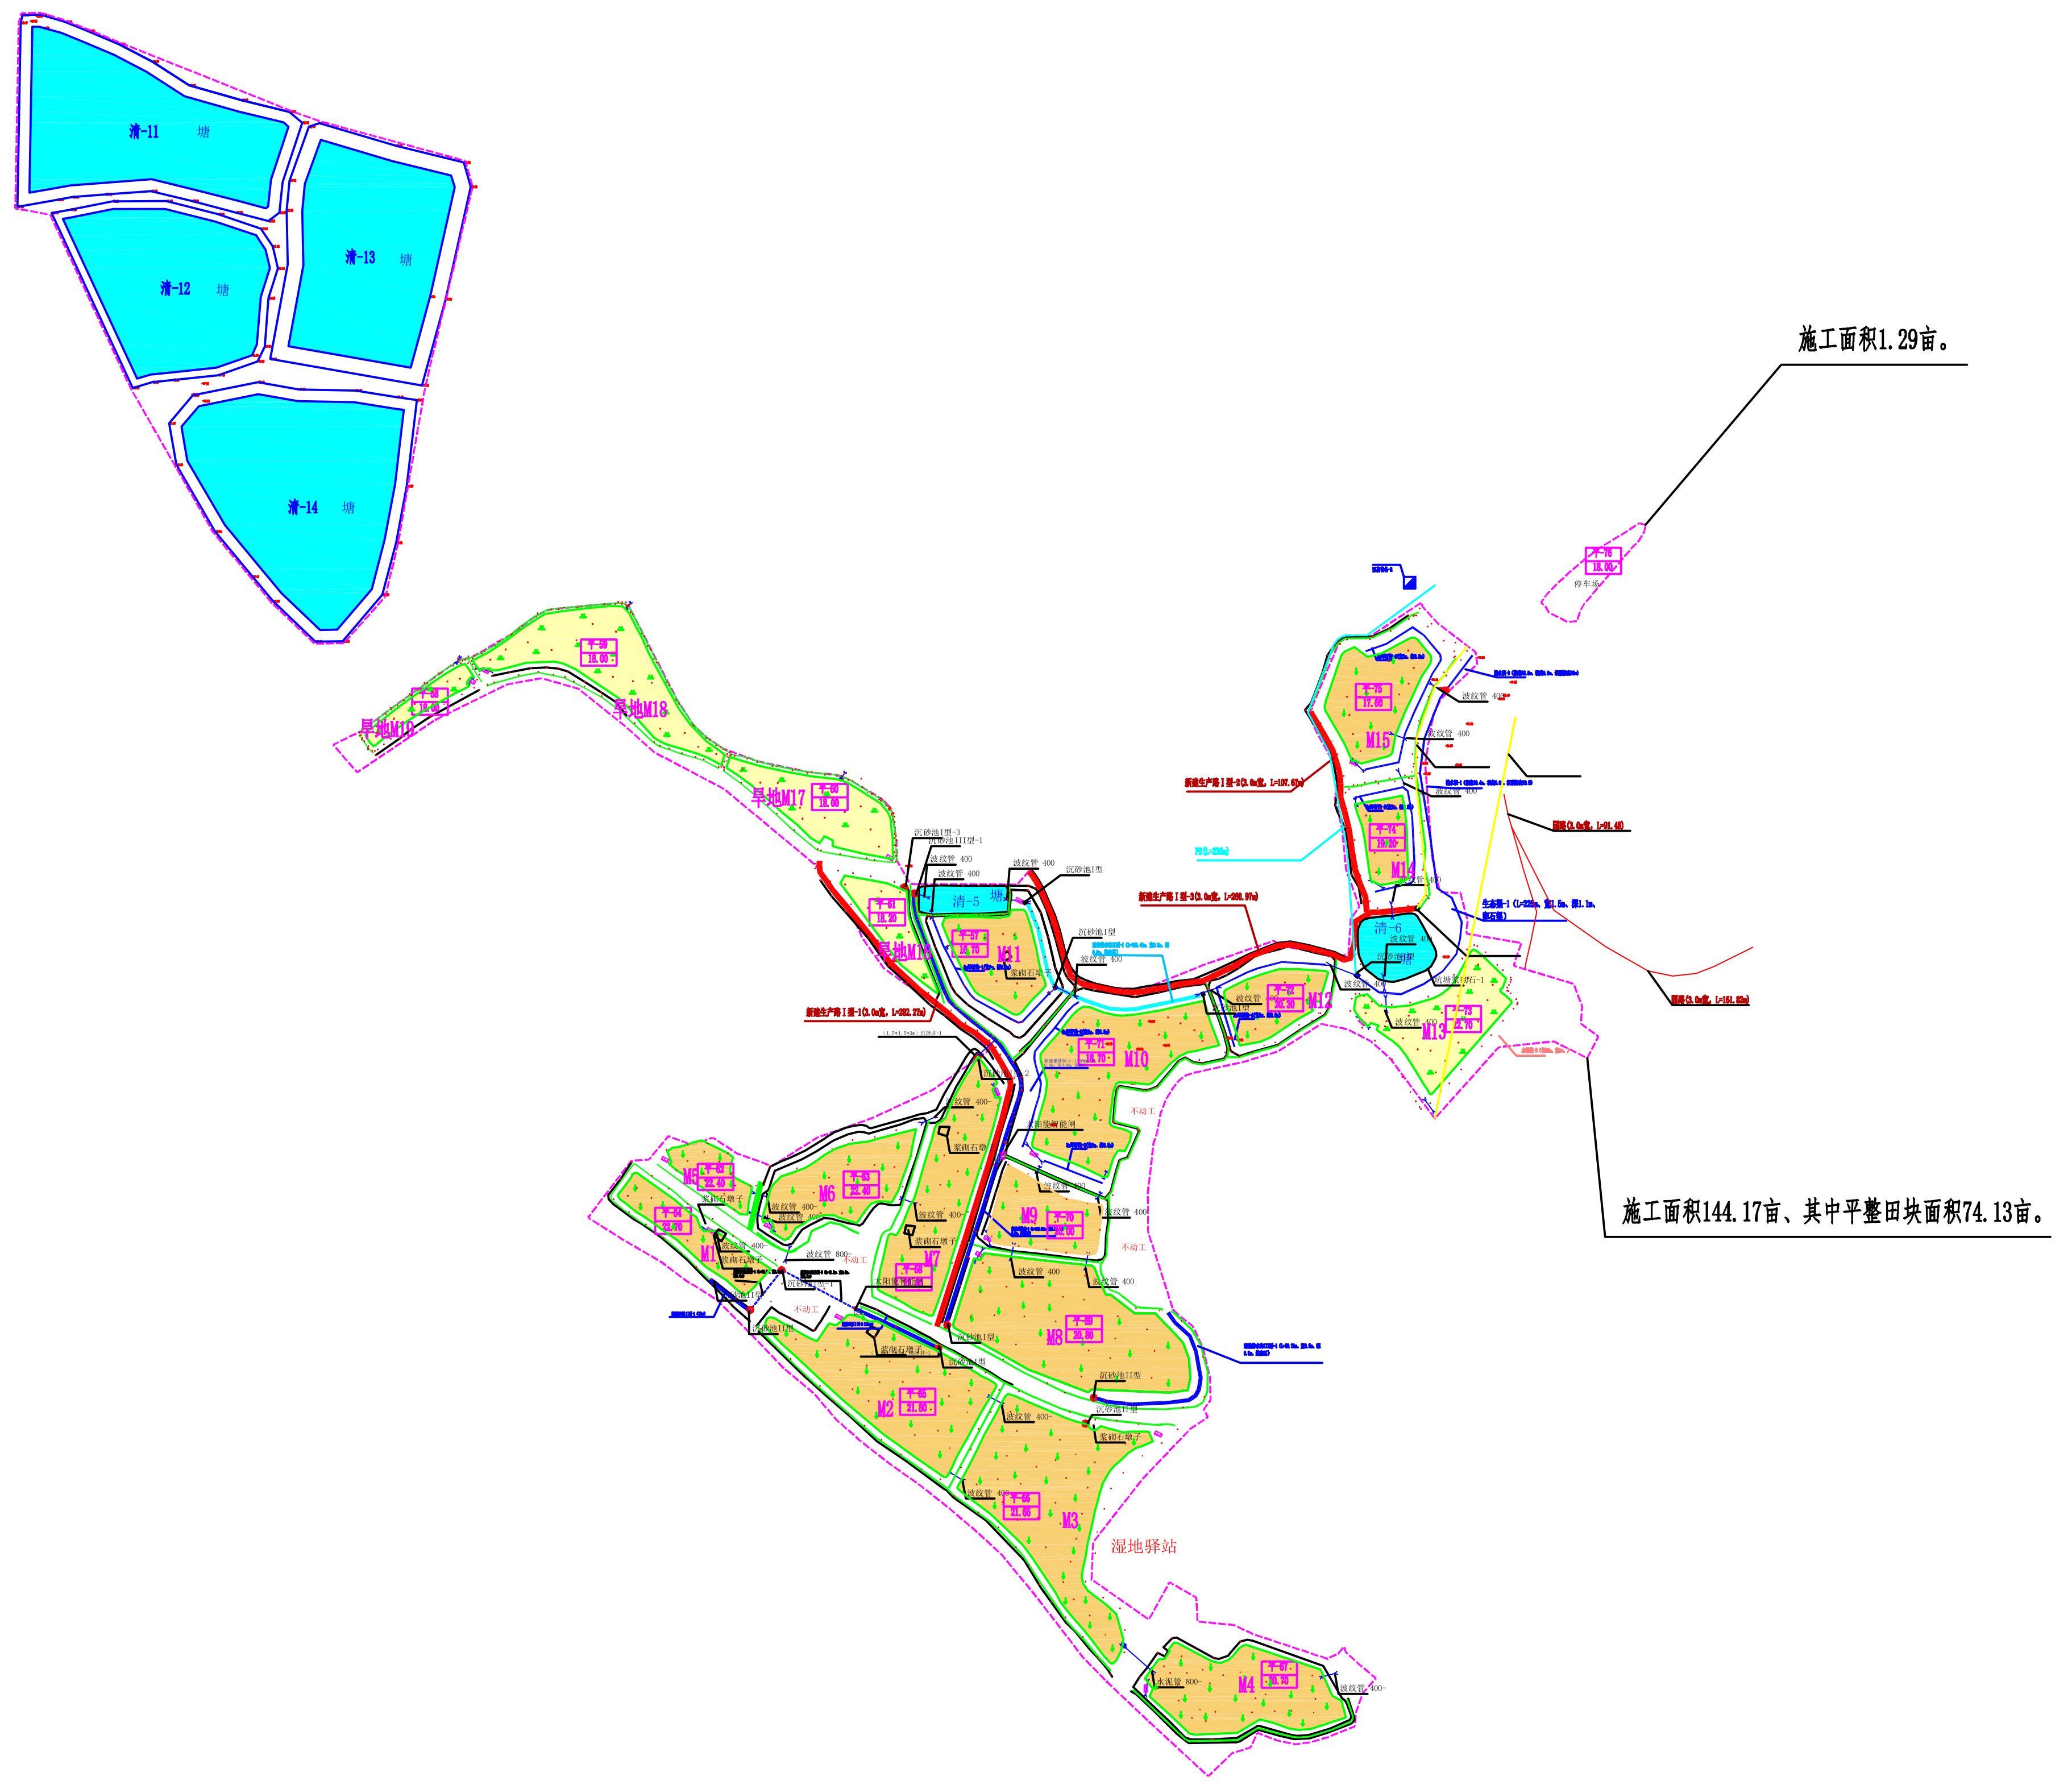

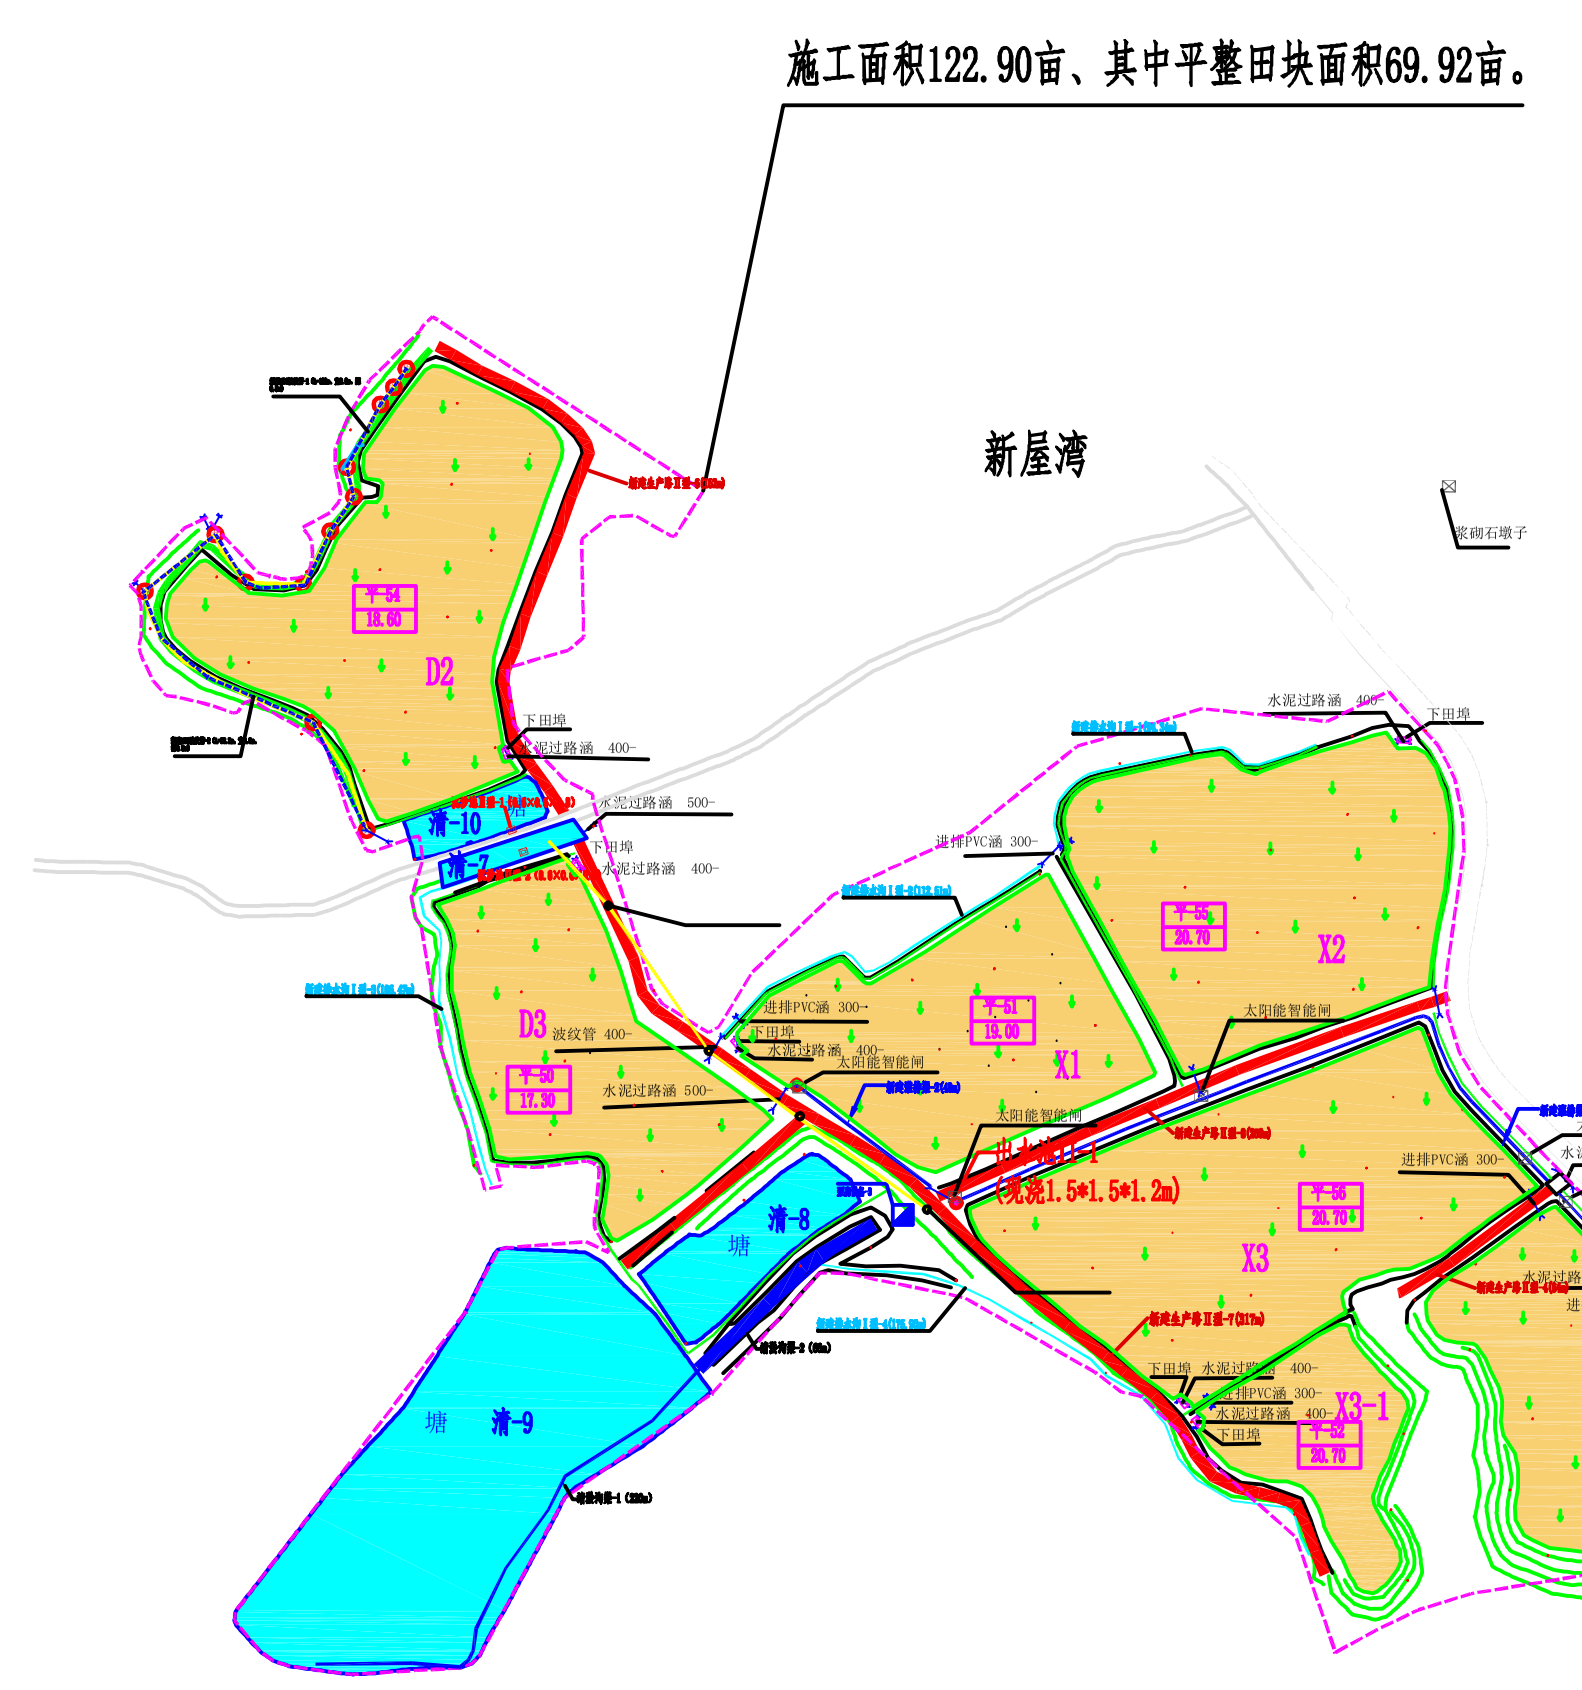

## 2022年度梁子湖区梁子镇沙湾村提质改造旱改水项目（分割二）
## （2022年度梁子湖区梁子镇全域国土综合整治项目子项目工程量汇总表

| 序号 | 名　称 | 单　位 | 验收工程量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 二 | **建设内容** | | | |
| (一) | **土地平整工程** | | | |
| 1 | **施工范围面积** | 亩 | **667.000** | 总施工面积 |
| 2 | **其中田块平整面积** | 亩 | **386.825** | |
| 3 | **其中坑塘水面面积** | 亩 | **115.78** | |
| 4 | **路、渠、沟、坟地、点状供地** | 亩 | **164.391** | 清障 |
| 5 | 挖方量 | m3 | 230218.400 | |
| 6 | 填方量 | m3 | 75576.800 | |
| 7 | 表土剥离方量 | m3 | 77105.829 | |
| 8 | 表土回填方量 | m3 | 77105.829 | |
| 9 | 推土机推土 | m3 | 75576.800 | |
| 10 | 土方内转 | m3 | 42696.400 | |
| 11 | 犁底层压实保水 | m3 | 42739.139 | |
| 12 | 土方外运转 | m3 | 154641.600 | |
| 13 | 土地翻耕 | 公顷 | 25.788 | |
| 14 | 土壤培肥 | 吨 | 2146.752 | |
| 15 | 田埂修筑 | m3 | 78529.368 | |
| (二) | **灌溉与排水工程** | | | |
| 1 | 沥水沟（0.5m*0.5m） | m | 18201.77 | |
| 2 | 清淤沟渠-1 | m | 220 | |
| 3 | 清淤沟渠-2 | m | 66 | |
| 4 | 新建农渠Ⅰ型-1（浆砌石、宽0.8m、高0.8m） | m | 39.00 | |
| 5 | 新建农渠Ⅰ型-2（浆砌石、宽0.8m、高0.8m） | m | 170.00 | |
| 6 | 新建农渠Ⅱ型-1（浆砌石、宽0.5m、高0.5m） | m | 407.00 | |
| 7 | 新建农渠Ⅱ型-2（浆砌石、宽0.5m、高0.5m） | m | 230.00 | |
| 8 | 新建农渠Ⅱ型-3（浆砌石、宽0.5m、高0.5m） | m | 95.35 | |
| 9 | 新建农渠III型-3（浆砌石、宽0.5m、高0.8m） | m | 205.00 | |
| 10 | 新建灌排渠-1（浆砌石、宽0.8m、高0.8m） | m | 272.00 | |
| 11 | 新建灌排渠-2（浆砌石、宽0.8m、高0.8m） | m | 40.00 | |
| 12 | 新建灌排渠-3（浆砌石、宽0.8m、高0.8m） | m | 266.00 | |
| 13 | 新建排水沟Ⅰ型-1（土沟、宽0.8m、高0.8m） | m | 94.32 | |
| 14 | 新建排水沟Ⅰ型-2（土沟、宽0.8m、高0.8m） | m | 112.51 | |
| 15 | 新建排水沟Ⅰ型-3（土沟、宽0.8m、高0.8m） | m | 106.47 | |
| 16 | 新建排水沟Ⅰ型-4（土沟、宽0.8m、高0.8m） | m | 175.90 | |
| 17 | 新建排水沟Ⅰ型-5（土沟、宽0.8m、高0.8m） | m | 411.50 | |
| 18 | 新建排水沟Ⅰ型-6（土沟、宽0.8m、高0.8m） | m | 392.45 | |
| 19 | 新建排水沟Ⅱ型-1（浆砌石、宽0.8m、高0.8m） | m | 123.46 | |
| 20 | 新建排水沟III型-1（浆砌石、宽0.5m、高0.5m） | m | 99.71 | |
| 21 | 新建排水沟III型-1（浆砌石、宽0.5m、高0.6m） | m | 234.00 | |
| 22 | 生态渠-1（卵石渠、宽1.5m、深1.1m） | m | 225.00 | |
| 23 | 生态渠-2（卵石渠、宽1.5m、深1.1m） | m | 294.73 | |
| 24 | 生态渠-3（卵石渠、宽1.5m、深1.1m） | m | 375.10 | |
| 25 | 2m环形沟-1（土沟、宽2m、深0.8m） | m | 93.69 | |
| 26 | 2m环形沟-2（土沟、宽2m、深0.8m） | m | 84.39 | |
| 27 | 2m环形沟-3（土沟、宽2m、深0.8m） | m | 32.08 | |
| 28 | 2m环形沟-4（土沟、宽2m、深0.8m） | m | 90.14 | |
| 29 | 2m环形沟-5（土沟、宽2m、深0.8m） | m | 95.17 | |
| 30 | 2m环形沟-6（土沟、宽2m、深0.8m） | m | 124.48 | |
| 31 | 坑塘清淤面积（坑塘5-17） | m² | 86300.15 | 清5-清17 |
| 32 | 清淤量 | m3 | 86300.15 | |
| 33 | 晒干推平 | m3 | 60410.11 | |
| 34 | 清淤土方外运 | m3 | 60410.11 | |
| 35 | 新建800波纹管-1（800） | m | 25.80 | |
| 36 | 新建800波纹管-2（800） | m | 41.30 | |
| 37 | 新建400波纹管-1（400） | m | 133.00 | |
| 38 | 新建400波纹管-2（400） | m | 98.20 | |
| 39 | DN400涵管（4m） | 座 | 60.00 | |
| 40 | DN600涵管（4m） | 座 | 3.00 | |
| 41 | DN800涵管（5.6m） | 座 | 1.00 | |
| 42 | DN1000涵管（7.8m） | 座 | 1.00 | |
| 43 | 放水口Ⅰ型 | 座 | 61.00 | |
| 44 | 放水口Ⅱ型（DN300pvc管） | 座 | 36.00 | |
| 45 | PE管道-1（DN250，SDR17） | m | 236.00 | |
| 46 | PE管道-2（DN250，SDR17） | m | 650.00 | |
| 47 | PE管道-2（DN250，SDR18） | m | 618.00 | |
| 48 | 坑塘浆砌石-1（宽1.5m、高1.5m） | m | 146.00 | |
| 49 | 漫水坝-1（宽0.5m、高0.5m） | 座 | 2 | |
| 50 | 沉沙池Ⅰ型（1.5*1.5*3m） | 座 | 7 | |
| 51 | 沉沙池Ⅱ型（0.6*0.6*0.8m） | 座 | 6 | |
| 52 | 沉沙池Ⅲ型（1.0*1.0*1.5m） | 座 | 6 | |
| 53 | 出水池Ⅰ-1（2.5*2.5*1.5） | 座 | 1 | |
| 54 | 出水池Ⅱ-1（1.5*1.5*1.2） | 座 | 1 | |
| 55 | 砖砌排水沟 | m | 44.00 | |
| 56 | 浆砌石护坡I型 | 座 | 12 | |
| 57 | DN400手动塑料闸板 | 套 | 87.00 | |
| 58 | DN400铁闸板 | 套 | 11.00 | |
| 59 | 木栈道拆除 | m | 110 | |
| 60 | 跌水I型 | 座 | 4 | |
| 61 | 跌水II型 | 座 | 11 | |
| 62 | 台阶 | 座 | 3 | |
| 63 | 新建泵站-1 | 座 | 1 | |
| 64 | 景观石 | 吨 | 56.25 | |
| 65 | 农田监测系统 | 项 | 1.00 | |
| 66 | 果树（橙子树、柚子树、桃子树、桂花树、垂柳等） | 棵 | 1928 | 橙子树205棵、柚子树47棵、桃子树686棵、梨子树455棵、桂花树509棵、垂柳26棵 |
| 67 | 泵房取水口灌木 | m² | 205 | |
| 68 | 灌木 | m² | 1160 | (1160*36)株 |
| 69 | 边坡植草（黑麦草） | m² | 33178 | |
| 70 | 护栏网片 | m | 7732 | |
| 71 | 田埂防渗膜 | m² | 2296 | |
| 72 | 进水池（1.5*1.5*2m） | 座 | 1 | |
| 73 | 启动柜基础（1.5*1.5*0.2m） | 套 | 1 | |
| 74 | 浆砌石护坡II型 | 座 | 4 | |
| （三） | **田间道路工程** | | | |
| 1 | 新建生产路Ⅰ型-1（3.0m宽） | m | 282.27 | 50cm厚毛渣 |
| 2 | 新建生产路Ⅰ型-2（3.0m宽） | m | 107.67 | 50cm厚毛渣 |
| 3 | 新建生产路Ⅰ型-3（3.0m宽） | m | 260.97 | 50cm厚毛渣 |
| 4 | 新建生产路Ⅱ型-1（3.0m宽） | m | 562 | 20cm厚碎石 |
| 5 | 新建生产路Ⅱ型-2（3.0m宽） | m | 105.86 | 20cm厚碎石 |
| 6 | 新建生产路Ⅱ型-3（3.0m宽） | m | 671.12 | 20cm厚碎石 |
| 7 | 新建生产路Ⅱ型-4（3.0m宽） | m | 223.18 | 20cm厚碎石 |
| 8 | 新建生产路Ⅱ型-5（3.0m宽） | m | 64 | 20cm厚碎石 |
| 9 | 新建生产路Ⅱ型-6（3.0m宽） | m | 152 | 20cm厚碎石 |
| 10 | 新建生产路Ⅱ型-7（3.0m宽） | m | 317 | 20cm厚碎石 |
| 11 | 新建生产路Ⅱ型-8（3.0m宽） | m | 250 | 20cm厚碎石 |
| 12 | 新建生产路Ⅱ型-9（3.0m宽） | m | 267 | 20cm厚碎石 |
| 13 | 新建生产路Ⅱ型-10（3.0m宽） | m | 64 | 20cm厚碎石 |
| 14 | 新建生产路Ⅱ型-11（3.0m宽） | m | 393 | 20cm厚碎石 |
| 15 | 新建生产路III型-1（2m宽） | m | 285 | 20cm厚碎石 |
| 16 | 新建生产路III型-2（2m宽） | m | 164 | 20cm厚碎石 |
| 17 | 下田埠Ⅱ型（浆砌石，长5.0m，宽4.0m） | 座 | 67 | 20cm厚碎石 |
| 18 | 新建栏杆 | m | 46 | |
| 19 | 修复栏杆 | m | 166 | |
| 20 | 新建电线杆 | 根 | 4 | |
| 21 | 拆除电线杆 | 根 | 10 | |
| 22 | 田块标识牌 | 个 | 100.000 | |
| 23 | 农田展示牌 | 个 | 50 | |
| (四) | **机电安装工程** | | | |
| 1 | 配电线-1 | m | 50.00 | |
| 2 | 配电线-2 | m | 200.00 | |
| 3 | 配电线-3 | m | 141.00 | |
| 4 | 水泵设备-1 | 套 | 1 | |
| 5 | 水泵设备-2 | 套 | 1 | |
| 6 | 水泵设备-3 | 套 | 1 | |
| 7 | 水泵设备-4 | 套 | 2 | |
| 8 | 变压器-1 | 套 | 1 | |
| 9 | 变压器-2 | 套 | 1 | |

## 2022年度梁子湖区梁子镇沙湾村等3个村提质改造旱改水项目
## （2022年度梁子湖区梁子镇全域国土综合整治项目子项目）（分割二）验收明细表

单位：公顷

| 土地利用现状表（整理前） | | | | | | | | | 土地利用现状表（整理后） | | 合计 | 新增水田面积 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地块号 | 乡镇名称 | 村名 | 所在图幅号 | 建设规模 | 建设规模（分割一） | 建设规模（分割二） | 图斑号 | 旱地（0103） | 水田（0101） | 旱地（0103） | | | |
| 地块13 | 梁子镇 | 沙湾村 | H50G042011 | 90.2228 | 45.7153 | 44.5075 | 305 | 0.1421 | | 0.1421 | 0.1421 | 0.0000 | |
| 地块16 | 梁子镇 | 沙湾村 | H50G042010、H50G043010 | | | | 574 | 5.6330 | 2.7938 | 2.8392 | 5.6330 | 2.7938 | 分割二 |
| 地块17 | 梁子镇 | 沙湾村 | H50G042010、H50G043010 | | | | 296 | 3.7892 | 1.7271 | 2.0621 | 3.7892 | 1.7271 | 分割二 |
| 地块19 | 梁子镇 | 沙湾村 | H50G042010 | | | | 318 | 3.0437 | 1.6157 | 1.4280 | 3.0437 | 1.6157 | 分割二 |
| 地块25 | 梁子镇 | 沙湾村 | H50G042010 | | | | 211 | 0.9808 | 0.8885 | 0.0923 | 0.9808 | 0.8885 | 分割二 |
| 地块31 | 梁子镇 | 沙湾村 | H50G042011 | | | | 568 | 9.1439 | 3.2412 | 5.9027 | 9.1439 | 3.2412 | 分割二 |
| 地块34 | 梁子镇 | 沙湾村 | H50G042010 | | | | 98 | 1.0432 | 0.2827 | 0.7605 | 1.0432 | 0.2827 | 分割二 |
| 地块35 | 梁子镇 | 沙湾村 | H50G042011 | | | | 96 | 2.2036 | 0.9823 | 1.2213 | 2.2036 | 0.9823 | 分割二 |
| 地块36 | 梁子镇 | 沙湾村 | H50G042010 | | | | 673 | 0.3466 | | 0.3466 | 0.3466 | 0.0000 | |
| 地块40 | 梁子镇 | 沙湾村 | H50G042011 | | | | 67 | 1.0896 | 0.5659 | 0.5237 | 1.0896 | 0.5659 | 分割一 |
| 地块41 | 梁子镇 | 沙湾村 | H50G042010 | | | | 63、673 | 2.9287 | 1.0993 | 1.8294 | 2.9287 | 1.0993 | 分割一 |
| 地块42 | 梁子镇 | 沙湾村 | H50G042010 | | | | 690 | 0.7118 | 0.5275 | 0.1843 | 0.7118 | 0.5275 | 分割一 |
| 地块43 | 梁子镇 | 沙湾村 | H50G042010 | | | | 57 | 1.2734 | 0.7112 | 0.5622 | 1.2734 | 0.7112 | 分割一 |
| 地块44 | 梁子镇 | 沙湾村 | H50G042010 | | | | 692 | 1.7328 | 0.9386 | 0.7942 | 1.7328 | 0.9386 | 分割一 |
| 地块45 | 梁子镇 | 沙湾村 | H50G042010 | | | | 704 | 1.7692 | 1.4892 | 0.2800 | 1.7692 | 1.4892 | 分割一 |
| 地块46 | 梁子镇 | 沙湾村 | H50G042010 | | | | 28 | 0.2248 | 0.1662 | 0.0586 | 0.2248 | 0.1662 | 分割一 |
| 地块47 | 梁子镇 | 沙湾村 | H50G042010 | | | | 28 | 1.1742 | 0.9300 | 0.2442 | 1.1742 | 0.9300 | 分割一 |
| 地块48 | 梁子镇 | 沙湾村 | H50G042010 | | | | 22 | 2.2593 | 1.8001 | 0.4592 | 2.2593 | 1.8001 | 分割一 |
| 地块49 | 梁子镇 | 沙湾村 | H50G042010 | | | | 10 | 2.9865 | 2.5905 | 0.3960 | 2.9865 | 2.5905 | 分割一 |
| 地块52 | 梁子镇 | 沙湾村 | H50G042010 | | | | 202 | 0.6567 | | 0.6567 | 0.6567 | 0.0000 | |
| 地块53 | 梁子镇 | 沙湾村 | H50G042010 | | | | 202 | 0.9862 | 0.8060 | 0.1802 | 0.9862 | 0.8060 | 分割二 |
| 合计 | | | | | | | | **44.1193** | **23.1558** | **20.96349** | **44.1193** | **23.15581** | |

## 图　例

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目区界 | 果　园 | 水库水面 | 电力线 | 生态渠I型 | 新建2m田埂 |
| 村　界 | 乡村路 | 泵　站 | 抽水平台 | 生态渠II型 | 新建1.5m田埂 |
| 镇　界 | 大车路 | 田　坎 | 清淤沟渠 | 生态渠III型 | 新建检查井 |
| 已实施项目范围 | 机耕桥 | 地类界 | 水流方向 | 新建暗管 | 新建砖砌池 |
| 水　田 | 涵　洞 | 小　路 | 坑　塘 | 田块编号 | 新建砖砌池 |
| 旱　地 | 河流水面 | 通信线 | 双线沟渠 | 碎石路 | |
| 林　地 | 灌木林地 | 坟　地 | 等高线.高程点 | 生产路 | |
| 荒草地 | 居民点 | 单线沟渠 | 注记坐标 | 新建排水沟 | |

# 2022年度梁子湖区梁子镇沙湾村提质改造旱改水项目（分割二）
# （2022年度梁子湖区梁子镇全域国土综合整治项目子项目）竣工图

| | | | |
|---|---|---|---|
| 竣工测量单位 | 北京跨时空国土规划设计院有限公司 | | |
| 审　定 | 卢战雷 | 测图比例尺 | 1:1000 |
| 校　核 | 陈志木 | 打印比例尺 | 1:4000 |
| 测　量 | 范　建 | 制图日期 | 2025.11 |
| 制　图 | 范　建 | 图　号 | |
